


RESTAURATION DU LAVOIR DE SAINT-HURUGE

Région : Bourgogne Franche Comté
Commune : Saint-Huruge
Code postal : 71460
Site : Lavoir

Département : Saône-et-Loire
Canton : Cluny
Intercommunalité : Communauté de Communes du Clunisois

Maître d'ouvrage : Mairie
Propriétaire : Commune de Saint-Huruge
Maître d'œuvre : TREMPIN Homme et Patrimoine
Architecte :
Responsable du projet : M. AVENAS

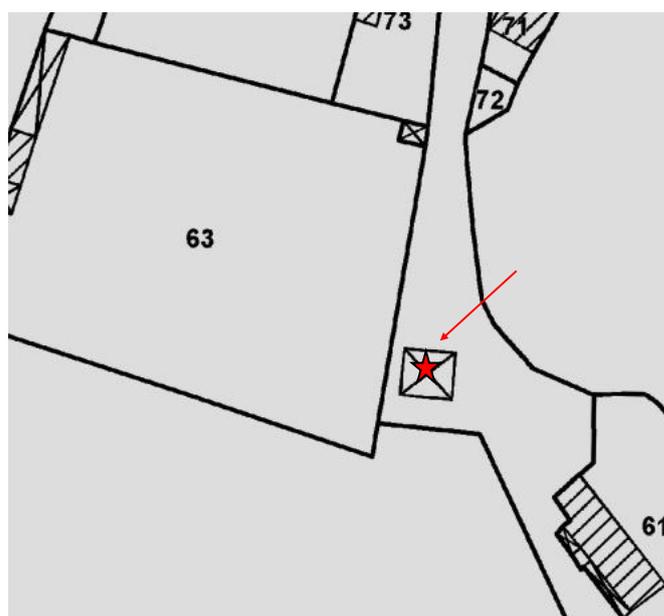

Longitude : 4°56'82"E – Latitude : 46°57'88"N – Altitude : 227 m

Etat des lieux :



Le lavoir est situé au Sud du bourg, à l'Est de l'emprise du château et de ses dépendances. Il appartient à un ensemble hydraulique composé d'une fontaine et d'un abreuvoir situé de l'autre côté de la route et d'un grand bassin situé dans le pré à l'Ouest.

La charpente est en bon état et aucune fuite n'a été identifiée, même si la couverture en tuiles plates est envahie par les mousses et est marquée par l'usure du temps. Par contre la faîtière et les rives méritent d'être reprises.

Les enduits intérieurs et extérieurs s'effritent progressivement et des zones entières laissent ressortir les maçonneries de pierre.

Des remontées d'eau signalent des fuites dans le dispositif d'alimentation.

Le bassin semble avoir conservé son étanchéité, mais demande un nettoyage complet

L'abreuvoir situé de l'autre côté de la route, n'est plus alimenté par le puit/fontaine et semble avoir des problèmes d'étanchéité.

Une canalisation part de l'abreuvoir, passe en canalisation sur la route, alimente le lavoir et poursuit son cheminement en contournant le lavoir avant de se jeter dans un ru.

Le mur de soutènement dans lequel est enchâssé le puit/fontaine présente des fragilités et mérite d'être repris.



Les étapes de la restauration :

Piquetage des maçonneries



Dégagement de la végétation sur le haut de mur de la fontaine



Démontage de la partie supérieure du mur de la fontaine



Remontage des assises du mur de la fontaine et dégagement du pavage



Jointoyage des maçonnerie du mur de la fontaine



Etanchéité de l'abreuvoir et pose d'un caniveau




Mur fontaine et abreuvoir restauré



Reprise des tuiles de rives et démoussage de la toiture



Reprise de la faîtière

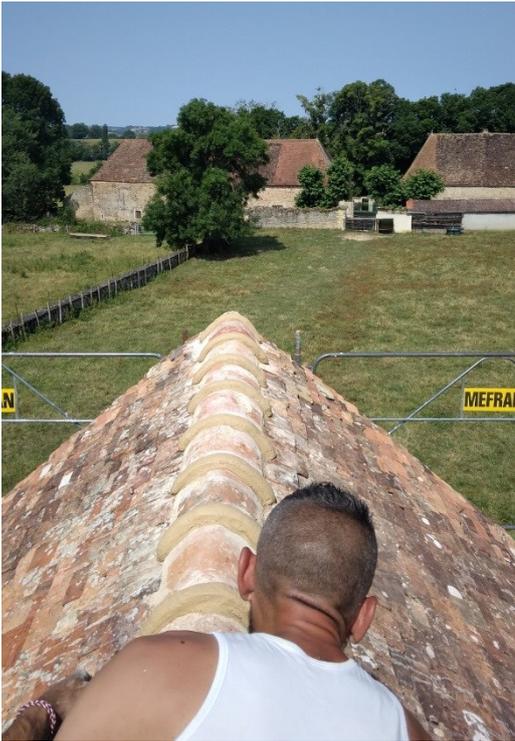

Réalisation des enduits en trois couches



Piquetage et purge
des maçonneries
intérieures



Réalisation d'une couche d'accrochage





Réalisation d'un goubetis



Essais de teinte pour les enduits de finition

Réalisation de la couche de finition extérieure





Application de la couche de finition



Enduits du muret



Enduits des murs intérieurs



Reprise du caniveau périphérique et installation d'une grille de regard
Nettoyage, rejointoyage et hydrofugeage du bassin





Contact :

TREMP LIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont- Site médiéval de Brancion - 711700 MARTAILLY-LES-BRANCION

Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com

<http://www.tremplinhp.com> - <http://www.tourdubost.com> - <https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>



Opération réalisée par :
TREMP LIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :
Nourdine ANLI SOULAIMANA, Brandon BRUCKER, Michel CLAUDIN,
Ghislain FEKAI RI, Arnaud LECLERRE,
Abderrahman MUHAMMAD -RFAN, Jean-Charles REMETER,
Gaëtan TERRIER
 sous la conduite de **Wilfried DUPONT & Loïc FLAGEUL**
 encadrants techniques.

Avec le soutien de la DDETS71 & du Ministère de la Justice



JUILLET 2023
