


RESTAURATION DU LAVOIR DE DREVIN

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Région : Bourgogne Franche Comté
Commune : Saint-Pierre-de-Varennnes
Code postal : 71670
Site : Lavoir de Drevin

Département : Saône-et-Loire
Canton : Le Creusot –2
Intercommunalité : Communauté Urbaine Le
Creusot-Montceau-les-Mines

Maître d'ouvrage : Mairie
Propriétaire : Commune de Saint-Pierre-de-Varennnes
Maître d'œuvre : TREMLIN Homme et Patrimoine
Responsable du projet : M. Gérard DURAND

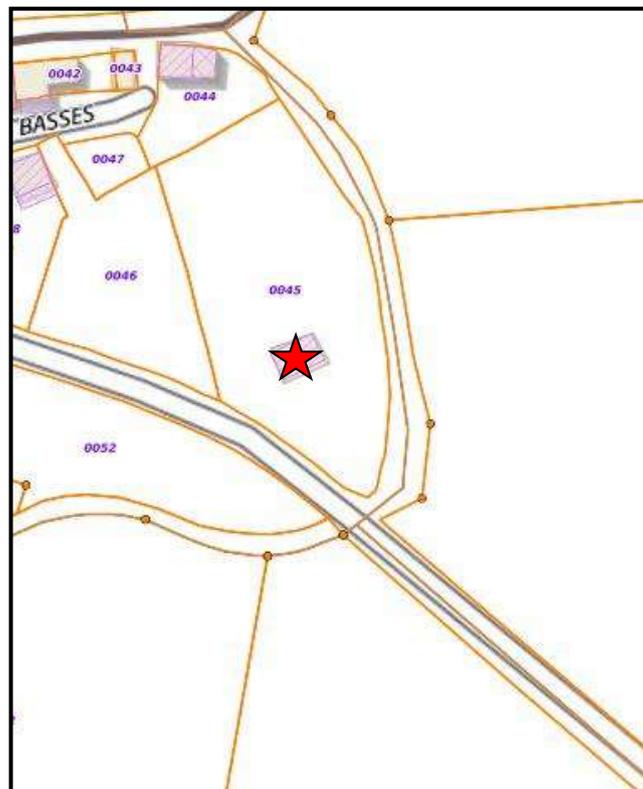

Longitude : 4°31'54''E – Latitude : 46°51'15''N – Altitude : 446 m

Etat des lieux :

Le lavoir de Drevin est situé sur le renforcement d'une parcelle donnant accès à un pré. Il est adossé à un mur de soutènement délimitant l'espace d'une parcelle située en contre-haut.

L'ensemble se compose d'un lavoir proprement dit, d'une source, et d'un abreuvoir qui sont alignés.

La source est positionnée entre le lavoir et l'abreuvoir et alimente les deux selon un schéma complexe qui repose sur le principe des vases communicants.

La végétation a envahi l'ensemble de longue date et l'eau ne s'évacue plus.

Les contours des trois éléments se devinent péniblement.

L'ensemble des maçonneries ont souffert et de nombreuses pierres sont déchaussées.

La circulation d'engins agricoles, qui passent trop près du lavoir n'est pas étrangère au mauvais état des maçonneries.

Le mur en pierre sèche au dos de l'ensemble est lui aussi envahi par la végétation et les racines de la haie plantée au dessus sont vraisemblablement à l'origine de l'effondrement d'une partie du mur.



Les Travaux :

Dégagement de la végétation,

Décasement des éléments constitutifs du lavoir, de la fontaine et de l'abreuvoir,

Tri des pierres et identification des pierres taillées,

Curage des bassin afin de retrouver les sols originels en briquettes,

Décapage des terres autour du complexe hydraulique, Pompage de la fontaine afin d'en vider le fond,

Repérage des canalisations reliant les différents éléments,





Restauration du mur de soutènement :

Dégagement de la végétation,

Dégagement du talus effondré,


Tri des pierres,

Remontage des assises du mur avec création de barbacanes pour permettre la circulation de l'eau.



Reprise des maçonneries des trois bassins, jointoyage et enduit,
repose des pierres taillées,
Remplacement des canalisations cassées ou disparues,
Banchage des arases pour mise à niveau et reprises et alignement de hauts de murs,
Traitement hydrofuge des fonds de bassins,
Réalisation d'une patine à la chaux teintée.



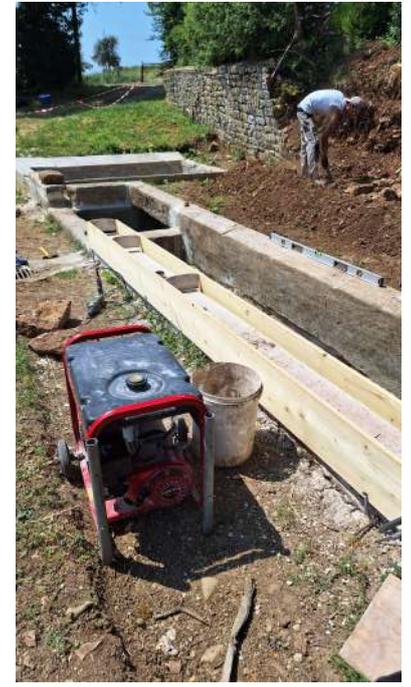

Reprise complète du circuit hydraulique avec stabilisation des niveaux,
Reprise sur l'évacuation et le trop plein,
Pose d'une buse et d'une grille pour faciliter l'écoulement des eaux,
Pose d'un géotextile sur l'ensemble de la surface périphérique.
Pose de gravillons.











Contact :

TREMPIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont- Site médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-

BRANÇION

Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com



Opération réalisée par :
Christian AGER, Philippe BRUGNIAUD, Joël CHEMINAT, Clément CORNAT,
Laurent DUCHESNE, Fabien HOEL, Christian LOUIS DIT MAUGIS, Frédéric
MONTAGNE, Jean-Philippe PAGE, Patricia RIVIERE, Dimitri RUIZ, Gilbert
SUZANON, Christophe VANNIER, Christophe WEGEL,

sous la conduite de Pierre MALBRANQUE & Jean-Baptiste PELLERAY
encadrants techniques

Avec le soutien de la DDETS71, du Département de Saône-et-Loire



Juillet 2024
