




Restauration à Brancion

Lettre d'information du chantier d'insertion **15**

Le 9 juillet dernier, nous en avons enfin terminé avec la restauration des maçonneries extérieures de la maison Rabut. Nous avons commencé ce travail en janvier et toute l'équipe a été mobilisée pour maçonner les quatre murs. Il nous aura fallu beaucoup d'efforts et de patience et nous espérons pouvoir nous consacrer à des travaux plus diversifiés maintenant. Dans la cave nous avons travaillé à deux au remplacement d'une solive que nous avons dû tailler avant de la mettre en place.

Sur la toiture, après avoir vérifié l'échafaudage pour travailler en toute sécurité nous avons déposé les tuiles et les laves. Nous avons planifié ces travaux sur 6 jours et malgré un effectif réduit nous avons terminé le travail en trois jours.

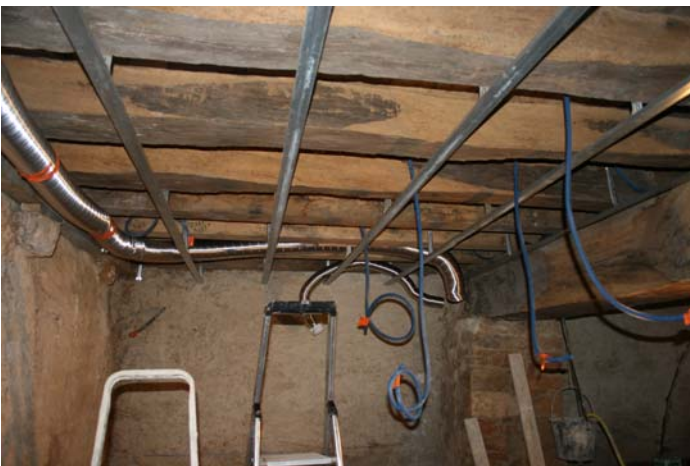

Dans la cave nous avons terminé la restauration du plafond. Nous avons gratté tous les bois pour arriver à la partie saine et nous y avons appliqué un produit de traitement contre les insectes. La cave n'étant pas très grande, nous avons rapidement été envahi par la poussière et par l'odeur du produit. Nous avons dû prendre les précautions nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Le travail a été mené à bien.

Avant de quitter le chantier pour les vacances, toute l'équipe a participé à une opération de grand nettoyage.

Depuis la reprise nous n'avons pas chômé. Au grenier, nous avons recalé les planchettes du sol avant de tendre un feutre sur lequel nous avons posé un treillis soudé, étapes préalable à la réalisation de la dalle en béton allégé. Après avoir pris les niveaux nous avons commencé de couler la dalle. Mais nous avons eu des surprises : nous n'avons jamais utilisé ce matériau et nous nous sommes rapidement rendu compte qu'il ne se mettait pas en œuvre comme le mortier habituel. Nous avons été obligés de nous adapter, mais nous avons mis plus de temps que prévu. Du coup, la dalle a été réalisée en deux étapes. Mais pour ne pas perdre trop de temps, plutôt que de monter les seaux à l'échelle, nous avons préféré monter directement la bétonnière sur le grenier : économie de temps et d'efforts !

Jean-Michel avait promis à Homa de lui apprendre à souder. Grâce à Christian qui a apporté un poste à souder, Jean-Michel a pu tenir sa promesse et après il nous a tous permis de faire des soudures sur des morceaux de ferraille. Bien sûr ce n'était qu'une initiation, mais Jean-Michel nous a encouragé à poursuivre. Peut-être aurons-nous droit à une nouvelle séance pour approfondir...



Siegfried (le père Noël) est de retour. Il a repris le travail de taille de laves. David, le petit nouveau de l'équipe est allé s'y essayer, mais il n'est pas resté très longtemps. Il préfère s'occuper de la charpente. Mais attention nous allons devoir descendre l'une des deux grosses poutres.... Avant de retailler une nouvelle ferme.

Avec le concours de :

Fonds Social Européen
Ministère de la Justice
Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle
Conseil Général de Saône-et-Loire
Fondation d'Entreprise VINCI pour la Cité
Fondation du Patrimoine
La Caisse d'Epargne
GEPSA



Contact :

TREMP LIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
Phare@tourdubost.com
<http://www.tourdubost.com>
